Plano de Gerenciamento de Configuração

Projeto	A Ponte dos Juros - A Jornada Contra o Dragão da Dívida
Gerente de Projetos	Renan Batista Dos Santos
Fábrica de Software	Evolução dos Juros

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
04/03/2026	1.0	Elaboração inicial do documento com definições de projeto, equipe e ferramentas.	Evelyn Lobo Silveira. Joice de Oliveira Fernandes. Patrick Gonçalves Gusmão. Renan Batista Dos Santos.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 4
1.1. Objetivos 4
1.2. Escopo 4
1.3. Definições, Acrônimos e Abreviações 4
1.4. Referências 4
1.5. Evolução 4
2. GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE 5
2.1. Organização, Responsabilidades e Interfaces 5
2.2. Ferramentas, Ambientes e Infraestrutura 6
2.2.1. Ferramentas 6
2.2.2. Ambientes e Infraestrutura 6
3. O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO 8
3.1. Identificação da Configuração 8
3.1.1. Métodos de Identificação 8
3.1.2. Baselines do Projeto 8
3.1.3. Estrutura do Repositório 8
3.2. Controle de Configuração e Mudança 9
3.2.1. Processo de Solicitações de Mudança 9
3.2.2. Comitê de Controle de Mudança (CCB) 9
3.3. Estimativa do Status de Configuração 10
3.3.1. Processo de Armazenamento e Liberação do Projeto 10
3.3.2. Relatórios e Auditorias 10
4. MARCOS 10
5. TREINAMENTO E RECURSOS 12
6. CONTROLE DE SOFTWARE DE SUBCONTRATADOS E FORNECEDORES 13

1. INTRODUÇÃO

O Plano de Gerenciamento de Configuração descreve todas as atividades do Gerenciamento de Controle de Configuração e Mudança que serão executadas durante o ciclo de vida do produto. Suas atividades envolvem identificar a configuração do software, manter sua integridade durante o projeto e controlar sistematicamente as mudanças.

1.1. Objetivos

O jogo tem como objetivo ensinar e apoiar o ensino de matemática aplicada, especialmente no que tange a juros simples e compostos, dentro do contexto da educação financeira no Ensino Fundamental II para o 9° ano com base na competência EF09MA05 da BNCC.

1.2. Escopo

Este Plano de Gerenciamento de Configuração é destinado a todos os integrantes da equipe Evolução dos Juros e abrange o controle e gerenciamento da configuração do projeto A Ponte dos Juros - A Jornada Contra o Dragão da Dívida , incluindo código-fonte, documentação, artefatos de build e ambiente de desenvolvimento.

1.3. Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo	Descrição
BNCC	*Base Nacional Comum Curricular*

1.4. Referências

- *Template* do Plano de Gerenciamento de Configuração, RUP 7.0, IBM.
- Plano do Projeto <criar link para o plano do projeto>
- Cronograma do Projeto <criar link para o cronograma do projeto>

1.5. Evolução

O Plano de Gerenciamento de Configuração deve ser mantido atualizado para refletir o planejamento corrente. Dessa forma, as seguintes situações representam gatilhos para atualização do plano e nova aprovação deste documento:

- Mudança nos itens de configuração;
- Mudança na identificação dos arquivos;
- Mudança na identificação das *Tags*/*Branches*;
- Mudança no padrão de versionamento;

- Gerência de Configuração de Software

1.6. Organização, Responsabilidades e Interfaces

Funções	Responsabilidades
Gerente de Projeto: Renan Batista Dos Santos	Responsável por solicitar a criação dos ambientes dos projetos, geração de linha de base, autorizar Requisições de Mudança, acompanhar resolução de defeitos de GCS, apoiar na elaboração/adaptação do Plano de Gerência de Configuração, validar adaptações no repositório e demais ferramentas de apoio, distribuir e acompanhar execução das tarefas que envolvam criação/atualização de artefatos no repositório, realizar análises de impacto com o apoio do CCM e apoiar a execução do processo de GCS pela equipe do projeto.
Gerente de Configuração: Evelyn Lobo Silveira.	Responsável por elaborar e manter as Políticas de Gerenciamento de Configuração, desenvolver, manter e divulgar os procedimentos e definir o uso das respectivas ferramentas, apoiar a equipe do projeto relativo à conformidade das linhas de base do projeto e produto, com as regras e os procedimentos de gestão de configuração.
Analista de Configuração: Joice de Oliveira Fernandes.	Responsável por criar/adaptar e auditar a correta execução do Processo de GCS pelos Colaboradores da Equipe do Projeto, realizar verificações nos artefatos em relação aos critérios de GCS, gerar *baselines*, gerenciar *branches* e comunicar a equipe do projeto e Envolvidos Interessados em relação às entregas efetuadas, criação de *branches*, defeitos de GCS e liberação de artefatos para atualização após aprovação de Requisição de Mudança.
Comitê de Mudanças: Patrick Gonçalves Gusmão.	Equipe multidisciplinar composta por colaboradores envolvidos no projeto, Gestores, Coordenadores e Gerentes com o objetivo de avaliar o impacto de mudanças.
Colaborador da Equipe: Evelyn Lobo Silveira. Joice de Oliveira Fernandes. Patrick Gonçalves Gusmão. Renan Batista Dos Santos.	Profissionais envolvidos na execução do projeto, sob coordenação do Gerente de Projeto, que farão uso do repositório e demais ferramentas de apoio que deverão obedecer ao processo e os critérios de qualidade previstos no Plano de GCS e corrigir defeitos apontados nas revisões de GCS.
Envolvidos Interessados: Evelyn Lobo Silveira.	Integrantes da equipe de execução do projeto, Gestor do projeto, patrocinadores, usuários e demais interessados elencados pelo Gerente do Projeto.
Banco de Dados: Renan Batista Dos Santos.	Equipe responsável pela configuração e disponibilização dos diversos banco de dados necessários para o desenvolvimento, testes, homologação e produção.
Teste: Patrick Gonçalves Gusmão.	Equipe responsável pela execução dos testes planejados para cada versão do sistema e registro dos defeitos em não conformidades identificadas.
Infraestrutura: Joice de Oliveira Fernandes.	Equipe responsável pela infraestrutura computacional do projeto, rede e comunicação dos diversos ambientes. Trabalha em parceria com a Equipe de GCS com o objetivo de atender às demandas do projeto.

1.7. Ferramentas, Ambientes e Infraestrutura

1.7.1. Ferramentas

Termo	Versão	Descrição
Godot	5.1.1	Ferramenta de administração dos repositórios e usuários SVN, serviço disponibilizado no endereço: https://svnadm.saude.gov/csvn/
Git Hub		
Jira		

1.7.2. Ambientes

O ambiente que será entregue a equipe de desenvolvimento, deverá ser mantido pela equipe de arquitetura, através de *Virtual Machines* que seguiram os padrões dos ambientes mantidos pela equipe de infraestrutura. As ferramentas de desenvolvimento "*IDEs*" serão de livre escolha do desenvolvedor, desde que a mesma seja uma ferramenta de Software Livre, tais como *Atom*, *Eclipse*, *NetBeans* ...

1.7.3. Infraestrutura

1.7.3.1. Desenvolvimento

É o ambiente que servira como integração dos códigos fontes que estão sendo liberados pela equipe de desenvolvimento.

Tipo	Descrição
DNS	http://projeto.desenvolvimento.saude.gov
Load Balance	IP do servidor
Node 01	IP do servidor / Nome servidor
Node 02	IP do servidor / Nome servidor
Servidor NFS	IP do servidor / Nome servidor
Caminho Físico	/deploy/projeto
SMTP	smtp.aplicacao.saude.gov
Banco de Dados	ORACLE - IP : Porta
WebService	IP : Porta
Redis	IP : Porta

1.7.3.2. Homologação

É o ambiente que servirá como base para os testes e homologação pela área gestora dos códigos fontes e requisitos do sistema.

Tipo	Descrição
DNS	http://projeto.desenvolvimento.saude.gov
Load Balance	IP do servidor
Node 01	IP do servidor / Nome servidor
Node 02	IP do servidor / Nome servidor
Servidor NFS	IP do servidor / Nome servidor
Caminho Físico	/deploy/projeto
SMTP	smtp.aplicacao.saude.gov
Banco de Dados	ORACLE - IP : Porta
WebService	IP : Porta
Redis	IP : Porta

1.7.3.3. Treinamento

É o ambiente que servirá como treinamento de um *release* de produção, pela área gestora. Este ambiente é controlado e mantido de acordo com as políticas da GMUD.

Tipo	Descrição
DNS	http://projeto.desenvolvimento.saude.gov
Load Balance	IP do servidor
Node 01	IP do servidor / Nome servidor
Node 02	IP do servidor / Nome servidor
Servidor NFS	IP do servidor / Nome servidor
Caminho Físico	/deploy/projeto
SMTP	smtp.aplicacao.saude.gov
Banco de Dados	ORACLE - IP : Porta
WebService	IP : Porta
Redis	IP : Porta

1.7.3.4. Produção

É o ambiente de produção de um *release*. Este ambiente é controlado e mantido de acordo com as políticas da GMUD.

Tipo	Descrição
DNS	http://projeto.desenvolvimento.saude.gov
Load Balance	IP do servidor
Node 01	IP do servidor / Nome servidor
Node 02	IP do servidor / Nome servidor
Servidor NFS	IP do servidor / Nome servidor
Caminho Físico	/deploy/projeto
SMTP	smtp.aplicacao.saude.gov
Banco de Dados	ORACLE - IP : Porta

WebService	IP : Porta
Redis	IP : Porta

2. O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

2.1. Identificação da Configuração

2.1.1. Métodos de Identificação

Os artefatos serão organizados em pastas com nomes claros e padronizados, seguindo as normas do CLEAN CODE. O versionamento de arquivos será feito por meio do Git.

2.1.2. Baselines do Projeto

As baselines serão definidas a cada mudança de fase do projeto, e uma de encerramento.

Fase	Itens de Configuração
Fase 1	Pesquisa para Criação do Jogo
	Organização dos Resultados das Pesquisas
	Criação e Entrega do GDD Parcial
Fase 2	Pesquisa de Scripts, Assets e Afins
	Organização dos Arquivos
	Estudo da Ferramenta
Fase 3	Criação da Entrada
	Criação do Menu/Saguão
	Criação do Biblioteca
	Entrega N1
Fase 4	Criação dos Livros
	Criação das Fases
	Entrega N2
Encerramento	Criação e Entrega do GDD Completo
	Entrega do Jogo

2.1.3. Estrutura do Repositório

O detalhamento da estrutura de diretórios do repositório, será detalhada no documento PAP do projeto, que estará disponível na pasta de Gerencia de Configuração.

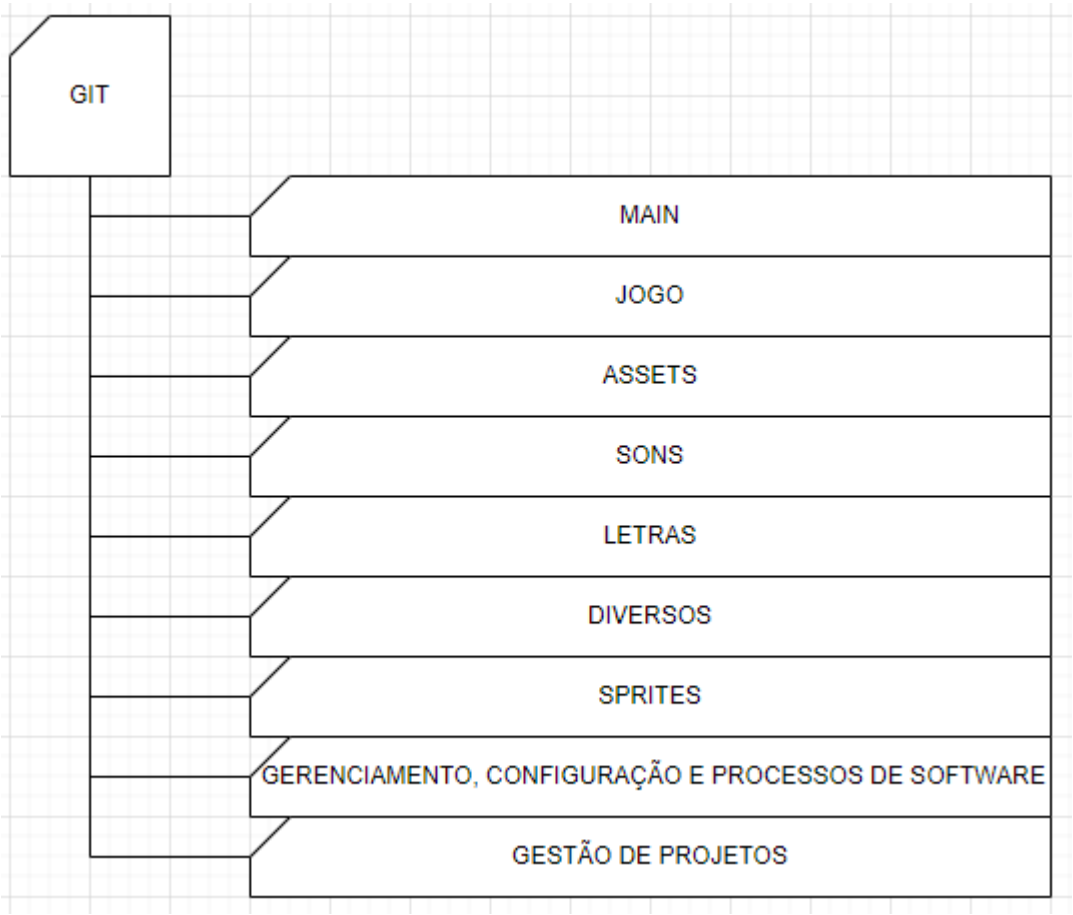

2.2. Controle de Configuração e Mudança

2.2.1. Processo de Solicitações de Mudança

1. Solicitação: enviar ideia proposta para o grupo pelo WhatsApp ou Teams;
2. Análise da Ideia: junção do grupo para análise da proposta e conclusão da viabilidade;
3. Alteração no GIT: fazer as devidas alterações no GIT conforme necessário considerando a proposta;
4. Verificação Final: verificar com a equipe se a alteração feita ficou conforme foi conversado.

2.2.2. Comitê de Controle de Mudança (CCB)

1. Membros: O CCB será composto por todos os membros da equipe de desenvolvimento, com o Gerente de Projeto atuando como facilitador.

2. Procedimentos: As decisões sobre mudanças significativas (ex: alteração de escopo, novas funcionalidades complexas) serão tomadas em reuniões semanais do CCB, com base na análise de impacto e consenso do grupo. Mudanças menores podem ser aprovadas via revisão de Pull Request.

2.3. Estimativa do Status de Configuração

2.3.1. Processo de Armazenamento e Liberação do Projeto

1. Armazenamento: O código-fonte e os artefatos serão armazenados no repositório GitHub, que oferece controle de versão e histórico completo. Backups automáticos são providos pelo GitHub.
2. Liberação: Cada release liberada incluirá um changelog/release notes detalhado e instruções de instalação/uso.

2.3.2. Relatórios e Auditorias

1. Relatórios: Serão gerados relatórios semanais de status do projeto, incluindo o número de Issues abertas/fechadas, e o progresso em relação aos marcos.
2. Auditorias: Auditorias de configuração serão realizadas ao final de cada fase principal do projeto para garantir que os itens de configuração estejam em conformidade com o PGC e que as políticas de controle de versão e mudanças foram seguidas.

3. MARCOS

1. Demonstração N1 (13/03/2026): mostrar o andamento do projeto até a entrega da n1;
2. Entrega N1 (03/04/2026):
    a. Organização do GIT
    b. Criação da Entrada
    c. Criação do Menu/Saguão
    d. Criação da Biblioteca

3. Entrega N2 (22/05/2026):
    a. Criação dos Livros
    b. Criação das Fases
4. Entrega N3 (03/07/2026):
    a. Revisão do GIT
    b. Entrega do Trabalho Finalizado
    c. Ajustes feitos no GDD

4. TREINAMENTO E RECURSOS

[Descreva as ferramentas de software, pessoal e treinamento requerido para implementar e especificar as atividades da gerência de configuração.]

5. CONTROLE DE SOFTWARE DE SUBCONTRATADOS E FORNECEDORES

[Descreva como o desenvolvimento de software externo ao ambiente do projeto será incorporado. Geralmente aplicado em processos de internalizações de softwares.]
